

Bilag: 1.1

El teknisk gennemgang af Skole

Firma: Skagen El Tekniq ApS

Medarbejder: Rasmus K Thorsen

Kontaktperson: RKT

Sagsnavn:
Håndbækskolen

Dato: 04-09-2025

Sagsnummer: 15121

Tegning nr:

Kontrolafsnit:

Adresse: Håndbækve 32A 9900 Frederikshavn

C1 – Fare til stede. Risiko for skade. Øjeblikkelig afhjælpning nødvendig (brugerens sikkerhed er i fare)

C2 – Potentiel farlig – akut afhjælpning nødvendig (brugerens sikkerhed kan være i fare)

C3 – Forbedring anbefales.

Alle observationer med en C1- eller C2- klassifikation resulterer i, at installationens overordnede tilstand rapporteres som utilfredsstillende.

C1 Manglende dæksel. Lokale 0,50




C1 Stikkontakt ikke fastgjort korrekt. Lokale 0,47



C3 Løse kabler i køkken, bygning Vest.



C3 Løse kabler over loft i teknikrum bygning Vest.

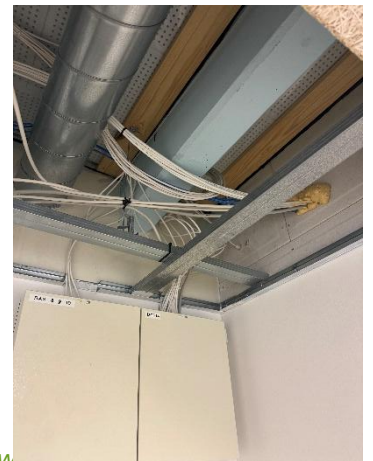

C2 løst kable til stikkontakt i bygning øst aula.



C2 Manglende låg på kanal i rengøringsrum Øst /nord



C2 Løse kabler i pedel værksted i kælder øst.





C2 Løst kabel for stik i bygning øst aula.



C2 Løse kabler i pedel værksted i kælder gang øst/nord.


4 billeder

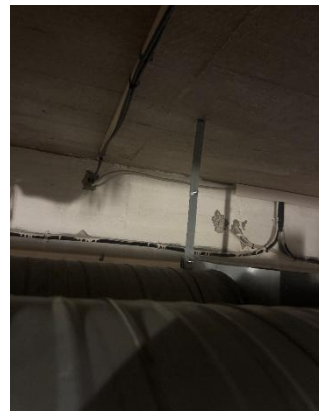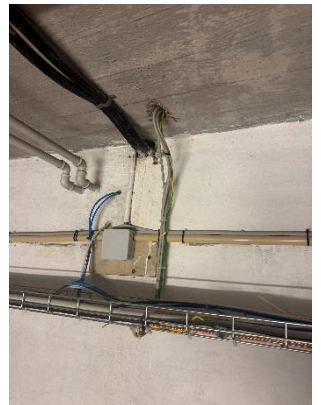

C2 Manglende låg i rock cafe bygning øst/syd.



C3 Manglende dåse på kabel beskyttelse rum kælder

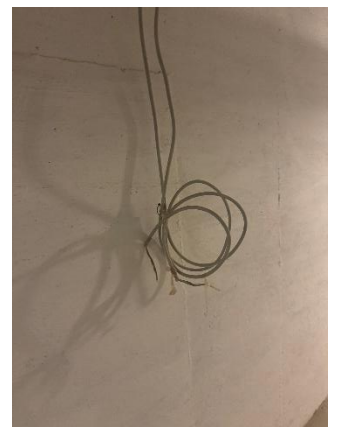

C2 manglende afskærmning på lamper i kælder øst/nord



C2 løst kabel i kælder øst/nord



C3 Manglende dåse på kabel beskyttelse rum kælder



C2 Løst kabel udvendig på gymnastiksal



C3 manglende dåse på samling gymnastiksal



C3 manglende dåse på samling teknik kælder under svømmehal




C3 manglende afskærmning teknik tavle under svømmehal



C3 Manglende dåse på kabel Gang kælder





C3 manglende dæksel i svømmehal lære omk.

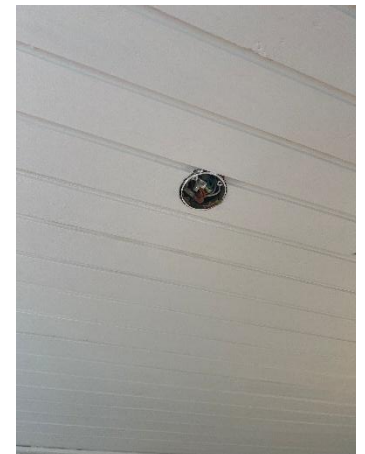

C3 manglende afskærmning i kælder gang Øst/syd.

Billede 1-4



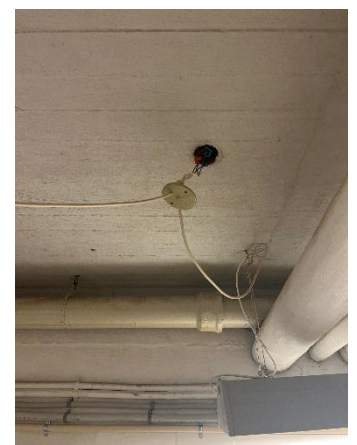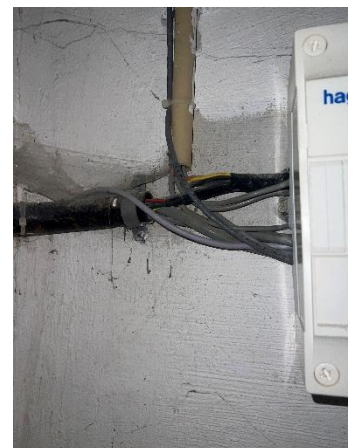

C2 manglende låg på kanal i kælder gang Øst/syd.



C3 Løst stik i sløjde Lokale K32 øst/syd kælder.



C2 kabler ikke fastgjort i kælder ventilationsrum bag elevator.

Billede 1



C2 kabler ikke fastgjort i kælder ventilationsrum bag elevator.

Billede 2

